


#	Задача	Статус	Исполнитель	Зависимости	Оценка, SP	Плановый спринт	Плановый срок	Факт. завершения	Отклонение, дн.	Итог по срокам
1	Регистрация по email	Готово	Backend Developer	-	2	1	18.05.2026	16.05.2026	-2	Досрочно
2	Авторизация	Готово	Backend Developer	Регистрация по email	2	1	18.05.2026	18.05.2026	0	В срок
3	Восстановление пароля	Готово	Backend Developer	Авторизация	2	1	18.05.2026	21.05.2026	3	С опозданием
4	Заполнение профиля	Готово	Mobile Developer	Авторизация	3	2	25.05.2026	24.05.2026	-1	Досрочно
5	Расчет дневной нормы калорий	Готово	Backend Developer	Заполнение профиля	5	2	25.05.2026	29.05.2026	4	С опозданием
6	Поиск продуктов	Готово	Backend Developer	-	5	2	25.05.2026	27.05.2026	2	С опозданием
7	Добавление приемов пищи	Готово	Mobile Developer	Поиск продуктов	3	2	25.05.2026	25.05.2026	0	В срок
8	Просмотр БЖУ	Готово	Backend Developer	Добавление приемов пищи	2	3	01.06.2026	29.05.2026	-3	Досрочно
9	Изменение порций	Готово	Mobile Developer	Добавление приемов пищи	2	3	01.06.2026	01.06.2026	0	В срок
10	Добавление тренировок	Готово	Mobile Developer	Заполнение профиля	3	3	01.06.2026	02.06.2026	1	С опозданием
11	Добавление веса	Готово	Mobile Developer	Заполнение профиля	2	3	01.06.2026	30.05.2026	-2	Досрочно
12	Просмотр графика веса	Готово	Backend Developer	Добавление веса	3	4	08.06.2026	08.06.2026	0	В срок
13	Просмотр форума	Готово	Mobile Developer	Авторизация	2	4	08.06.2026	07.06.2026	-1	Досрочно
14	Редактирование профиля	Готово	Mobile Developer	Заполнение профиля	2	4	08.06.2026	08.06.2026	0	В срок
15	Изменение пароля	Готово	Backend Developer	Авторизация	1	4	08.06.2026	06.06.2026	-2	Досрочно
16	Выход из аккаунта	Готово	Backend Developer	Авторизация	1	5	15.06.2026	14.06.2026	-1	Досрочно
17	История продуктов	QA-тестирование	Backend Developer	Добавление приемов пищи	3	5	15.06.2026			
18	История тренировок	QA-тестирование	Backend Developer	Добавление тренировок	2	5	15.06.2026			
19	Избранные продукты	QA-тестирование	Backend Developer	Поиск продуктов	2	5	15.06.2026			
20	Статистика БЖУ	QA-тестирование	Data Analyst	История продуктов	5	6	22.06.2026			
21	Статистика по дням и неделям	QA-тестирование	Data Analyst	Статистика БЖУ	3	6	22.06.2026			
22	Средняя калорийность	QA-тестирование	Data Analyst	История продуктов	2	6	22.06.2026			
23	Изменение единиц измерения	QA-тестирование	Mobile Developer	Заполнение профиля	2	7	29.06.2026			
24	Вход через Google	Код-ревью	Backend Developer	Авторизация	3	7	29.06.2026			
25	Вход через Apple ID	Код-ревью	Backend Developer	Авторизация	3	7	29.06.2026			
26	Вход через Facebook	Код-ревью	Backend Developer	Авторизация	3	7	29.06.2026			
27	Собственные продукты	Код-ревью	Backend Developer	Поиск продуктов	3	8	06.07.2026			
28	Собственные блюда	Код-ревью	Backend Developer	Собственные продукты	3	8	06.07.2026			
29	Копирование вчерашнего рациона	Код-ревью	Mobile Developer	История продуктов	2	8	06.07.2026			
30	Онбординг	В работе	UX/UI Designer	Регистрация по email	5	8	06.07.2026			
31	Ознакомление с Premium	В работе	UX/UI Designer	Онбординг	3	9	13.07.2026			
32	Настройка уведомлений	В работе	Mobile Developer	Авторизация	3	9	13.07.2026			
33	Настройка уровня активности	В работе	Backend Developer	Заполнение профиля	3	9	13.07.2026			
34	Настройка скорости похудения	В работе	Backend Developer	Расчет дневной нормы калори	5	9	13.07.2026			
35	Настройка соотношения БЖУ	В работе	Backend Developer	Расчет дневной нормы калори	5	10	20.07.2026			
36	Автоматический подсчет шагов	В работе	Mobile Developer	Разрешения устройства	5	10	20.07.2026			
37	Создание публикаций	В работе	Mobile Developer	Просмотр форума	3	10	20.07.2026			
38	Комментарии	В работе	Backend Developer	Создание публикаций	2	10	20.07.2026			
39	Лайки	В работе	Backend Developer	Создание публикаций	1	11	27.07.2026			
40	Экспорт данных	В работе	Backend Developer	История продуктов	3	11	27.07.2026			
41	Сканирование штрихкода	Готово к разработке	Mobile Developer	Поиск продуктов	5	11	27.07.2026			
42	Интеграция Fitbit	Готово к разработке	Backend Developer	История тренировок	5	12	03.08.2026			
43	Интеграция Garmin	Готово к разработке	Backend Developer	Интеграция Fitbit	5	12	03.08.2026			
44	Интеграция Apple Health	Готово к разработке	Backend Developer	История тренировок	5	12	03.08.2026			

45	Интеграция Apple Watch	Готово к разработке	Backend Developer	Интеграция Apple Health	5	12	03.08.2026			
46	Интеграция Google Fit	Готово к разработке	Backend Developer	История тренировок	5	13	10.08.2026			
47	Добавление блюда по фото	Готово к разработке	Mobile Developer	Поиск продуктов	8	13	10.08.2026			
48	Голосовой поиск	Готово к разработке	Mobile Developer	Поиск продуктов	5	13	10.08.2026			
49	AI-анализ питания	Бэклог	Backend Developer; Data Analyst	Статистика БЖУ	13	13	10.08.2026			
50	Персональные рекомендации	Бэклог	Data Analyst	AI-анализ питания	8	14	17.08.2026			
51	Личные сообщения	Бэклог	Backend Developer	Создание публикаций	5	14	17.08.2026			
52	Темная тема	Бэклог	Mobile Developer	-	2	14	17.08.2026			
53	Настройка главного экрана	Бэклог	UX/UI Designer	Темная тема	3	14	17.08.2026			
54	Просмотр достижений	Бэклог	Backend Developer	Статистика по дням и неделям	3	15	24.08.2026			
55	Челленджи	Бэклог	Backend Developer	Создание публикаций	5	15	24.08.2026			
56	Достижения	Бэклог	Backend Developer	Челленджи	3	15	24.08.2026			
57	Подписка Premium	Бэклог	Backend Developer	Ознакомление с Premium	8	15	24.08.2026			
58	Просмотр отзывов и рейтингов	Бэклог	Product Manager	Публикация приложения	3	16	31.08.2026			
59	Персональные подсказки	Бэклог	UX/UI Designer	AI-анализ питания	3	16	31.08.2026			
60	Указать пищевые ограничения	Бэклог	Mobile Developer	Заполнение профиля	2	16	31.08.2026			
61	Удаление аккаунта	Бэклог	Backend Developer	Авторизация	1	16	31.08.2026			
	ИТОГО				216					

Диаграмма сгорания проекта FatSecret

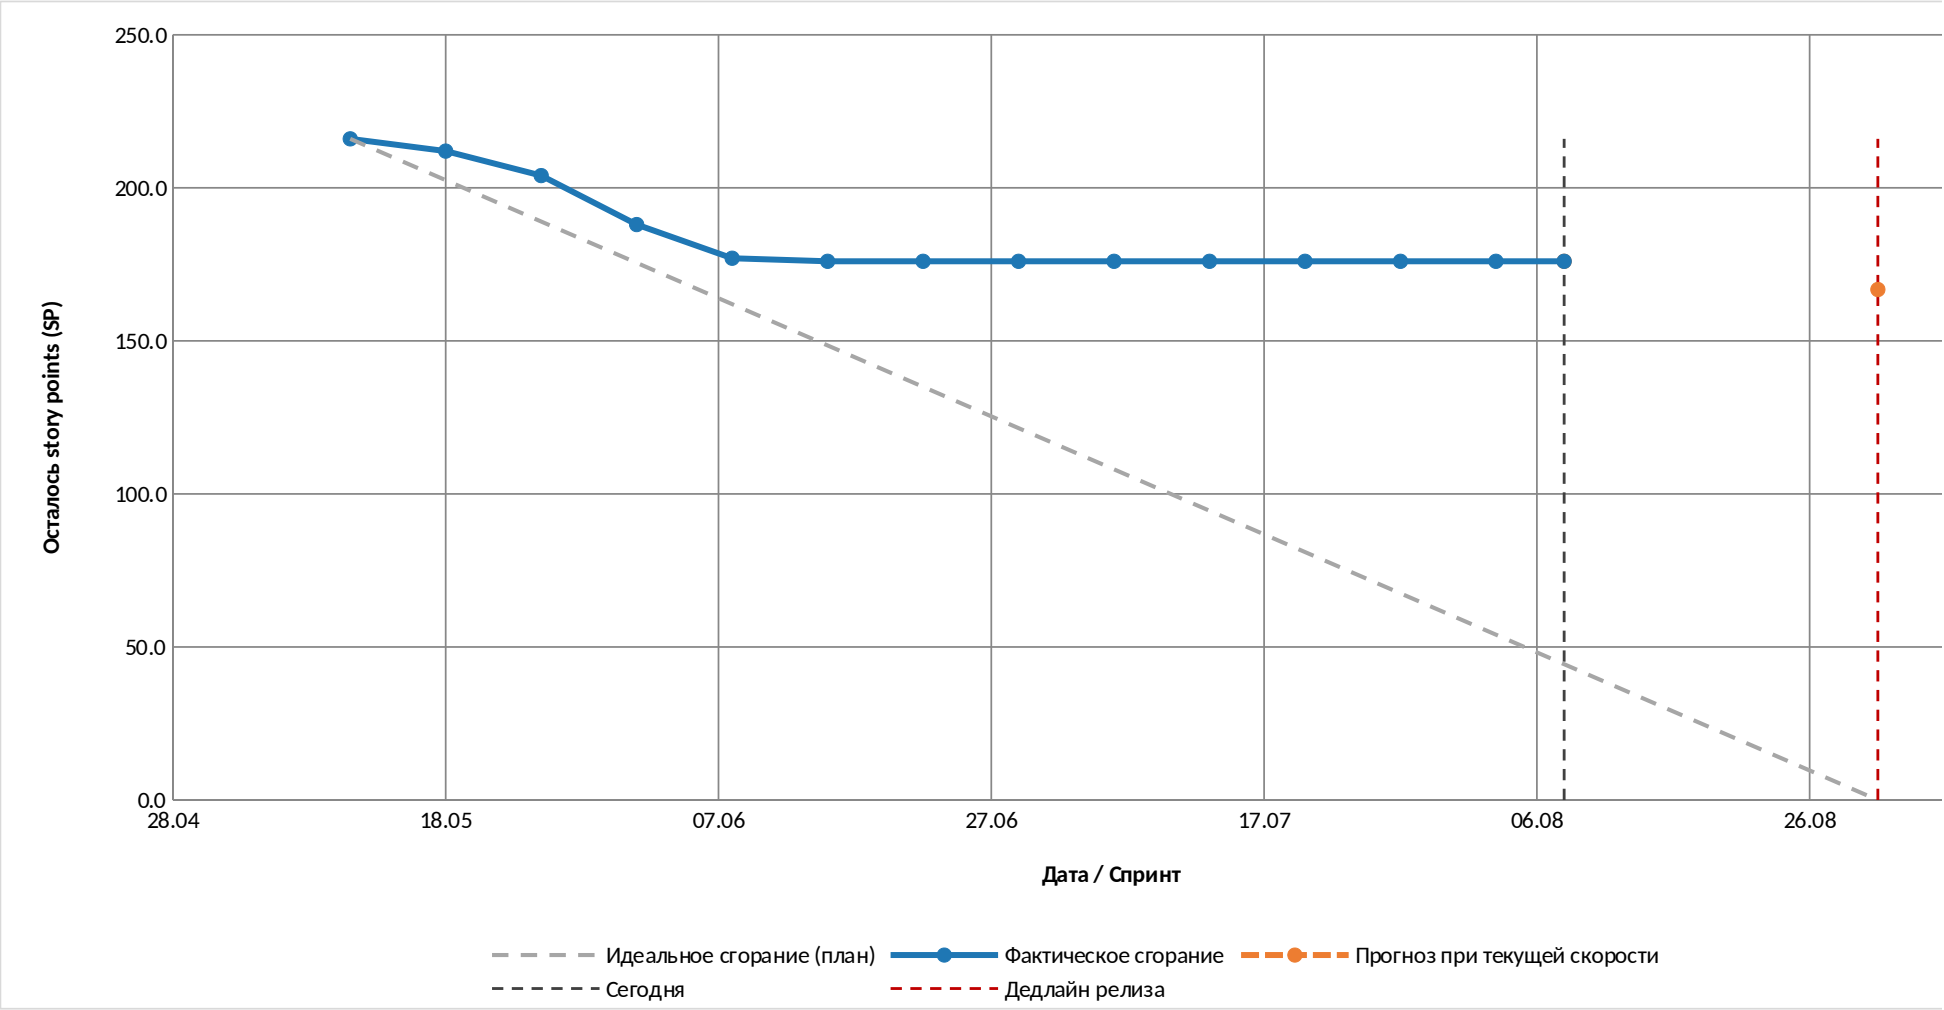

Ключевые показатели на сегодня

Общий объём проекта, SP	216.0
Выполнено (Done), SP	40.0
Осталось (факт), SP	176.0
Плановый остаток на сегодня (идеал), SP	44.4
Отставание от плана, SP	131.6
Прогноз остатка на дату дедлайна, SP	166.8
